


# OVERSIGTSPLAN FOR ETAPE OPDELING

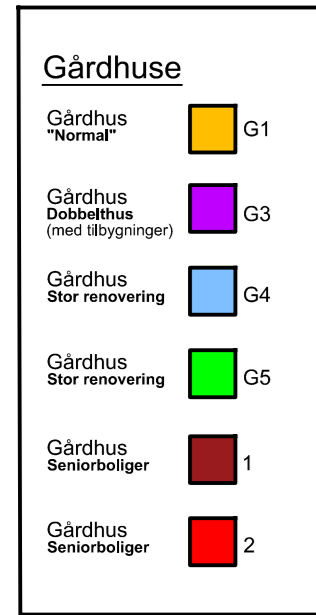

GÅRDHUSE	Opstart	Aflevering	Indflytning
Etape 1 G: Gårdhuse etape 1			
A	Afsluttet	Afsluttet	Afsluttet
B	Afsluttet	Afsluttet	Afsluttet
C	Afsluttet	Afsluttet	Afsluttet
Etape 2 G: Gårdhuse etape 2			
A	Afsluttet	Afsluttet	Afsluttet
B	Afsluttet	Afsluttet	01.03.2016
Etape 3 G: Gårdhuse etape 3			
A	14.09.2015	23.03.2016	01.04.2016
B	16.11.2015	15.05.2016	01.06.2016
Etape 4 G: Gårdhuse etape 4			
A	15.01.2016	01.07.2016	15.07.2016
B	15.03.2016	01.09.2016	15.09.2016
Etape 5 G: Gårdhuse etape 5			
A	17.05.2016	01.11.2016	15.11.2016
B	15.07.2016	01.01.2017	15.01.2017
C	15.09.2016	01.03.2017	15.03.2017
Etape 6 G: Gårdhuse etape 6			
A	01.01.2017	(Ikke afklaret)	
B	01.01.2017	(Ikke afklaret)	

BØRNEHAVE OG NY FORBINDELSSESVEJ	Opstart	Aflevering	Indflytning
Børnehaven	Uge 8 - 2016	Uge 50 - 2016	Uge 51 - 2016
Ny forbindelsesvej	Uge 6 - 2016	Uge 14 - 2016	-----

ETAPE OPDELING	Opstart	Aflevering	Indflytning
Byggeplads 01			
E.1.B: ETAPE 1. B			
Blok 07, 08	17.11.2014	01.07.2015	1 uge før indflytning
Blok 09	17.11.2014	15.07.2015	1 uge før indflytning
E.2.B: ETAPE 2. B			
Blok 10	01.02.2015	01.09.2015	1 uge før indflytning
Blok 11	01.02.2015	15.09.2015	1 uge før indflytning
E.3.B: ETAPE 3. B			
Blok 12	01.05.2015	01.11.2015	1 uge før indflytning
Blok 13	01.05.2015	01.12.2015	1 uge før indflytning
E.4.B: ETAPE 4. B			
Blok 06	01.08.2015	01.02.2016	1 uge før indflytning
Blok 05	01.08.2015	01.03.2016	1 uge før indflytning
E.5.B: ETAPE 5. B			
Blok 04	01.10.2015	01.04.2016	1 uge før indflytning
Blok 03	01.10.2015	01.05.2016	1 uge før indflytning
E.6.B: ETAPE 6. B			
Blok 02	01.01.2016	01.06.2016	1 uge før indflytning
Blok 01	01.01.2016	01.07.2016	1 uge før indflytning

Nedtagning byggeplads 01 + udv. arealer	Opstart	Aflevering	Indflytning
Bloktyper - Byggetid			
Byggeplads 02			
E.7.B: ETAPE 7. B			
Blok 18	15.03.2016	01.09.2016	1 uge før indflytning
Blok 19	01.04.2016	01.10.2016	1 uge før indflytning
E.8.B: ETAPE 8. B			
Blok 20	15.05.2016	01.11.2016	1 uge før indflytning
Blok 21	15.05.2016	01.12.2016	1 uge før indflytning
E.9.B: ETAPE 9. B			
Blok 22	01.08.2016	01.01.2017	1 uge før indflytning
Blok 23	01.08.2016	01.02.2017	1 uge før indflytning
E.10.B: ETAPE 10. B			
Blok 17	01.10.2016	01.03.2017	1 uge før indflytning
Blok 16	01.10.2016	01.04.2017	1 uge før indflytning
E.11.B: ETAPE 11. B			
Blok 15	15.11.2016	01.05.2017	1 uge før indflytning
Blok 14	15.11.2016	15.05.2017	1 uge før indflytning

Nedbrydning af vaskeri	Opstart	Aflevering	Indflytning
Nedbrydning af vaskeri	01.05.2017	01.07.2017	
Nedtagning Byggeplads 02 + udv. arealer			

D	Tidsplan oprettet	11.02.2016
C	Rækkefølge for etape E8B, E9B, E11B ændret	18.01.2016
B	Tidsplaner revideret	01.10.2014
REVISION: A	REVIDERET: Tidsplan fjernet fra nærværende tegning. Der henvises til udbudstidsplan	REV. DATO: 07.07.2014
SAG:	Gårdhus og blokke Kildeparken 2020, Afd. 51	SAGSNR: 301242
BYGHERRE:	Himmerland Boligforening A/S	INITIALER: PB
PROJEKT:	Oversigtstegning for Etape opdeling	KS: MAL: TEGN. NR.: (99)2.03D
EMNE:		FORMAT: A2
		DATE: 1:2000
		16/06/14
ARKITEKT:	KPF ARKITEKTER AS - MAA - MDB VISIONSVEJ 51 - 9000 AALBORG	TLF: 9813 3738
		MAIL: aalborg@kpf.dk
		WEB: www.kpf.dk
INGENIØR:	INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S STENVEJ 19 - 8270 HØJBJERG	TLF: 86273944
		MAIL: vm@vming.dk
		WEB: www.vming.dk
LANDSKABS-ARKITEKT:	PREBEN SKAARUP LANDSKAB GRAVEN 3 - 8000 AARHUS C	TLF: 86135677
		MAIL: landskab@prebenskaarup.dk
		WEB: www.prebenskaarup.dk

